

SUBMÉDIO SF

BAIXO SF

MÉDIO SF

ALTO SF

REPORT DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Nº 04

28/02/2025

Clique no mapa ao lado e navegue por região

[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia

Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo

TODA A BACIA DO SF

1. [APOIO AO COMITÊ NA LOGÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM REUNIÕES E EVENTOS](#)
2. [PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL](#)
3. [PROCESSO ELEITORAL DO CBHSF 2025](#)
4. [FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES](#)
5. [CAPACITAÇÃO IRRIGANTES DA BHSF](#)
6. [ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO \(PRH-SF 2016-2025\)](#)
7. [GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E OBRAS DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL](#)
8. **EM BREVE NA BHSF**

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

1. [INSTALAÇÕES DE UNIDADE DE APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE POVOS TRADICIONAIS \(UNEB\), EM JEREMOABO \(BA\)](#)
2. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM INHAPI \(AL\)](#)
3. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM PARICONHA \(AL\)](#)
4. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM JAGUARI \(BA\)](#)
5. [INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO SEMIÁRIDO, EM GLÓRIA \(BA\)](#)
6. [EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE](#)
7. [EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO MOCAMBO, EM CURAÇÁ \(BA\)](#)
8. [FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO E SUBMÉDIO SF](#)
9. [PIPs DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO SUBMÉDIO E BAIXO SF](#)
10. **EM BREVE NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO**

ALTO SÃO FRANCISCO

1. [PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITÁI-PACUÍ](#)
2. [FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITÁI-PACUÍ](#)
3. [PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE](#)
4. [FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE](#)
5. [PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PANDEIRO, CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU](#)
6. [FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PANDEIRO, CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU](#)
7. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EM JAÍBA \(MG\)](#)
8. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EM MAMONAS \(MG\)](#)
9. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EM PASSA TEMPO \(MG\)](#)
10. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO COLETIVO EM JEQUITIBÁ \(MG\)](#)
11. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JOAQUIM FELÍCIO \(MG\)](#)
12. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BAMBUÍ \(MG\)](#)
13. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNÁI \(MG\)](#)
14. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CARMO DO CAJURU \(MG\)](#)
15. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PASSA TEMPO \(MG\)](#)
16. [PROJETOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO](#)
17. **EM BREVE NO ALTO SÃO FRANCISCO**

MÉDIO SÃO FRANCISCO

1. [ESGOTAMENTO RURAL NO ENTORNO DA LAGOA DE ITAPARICA, EM XIQUE-XIQUE \(BA\)](#)
2. [SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE CURRALINHO, SÃO GABRIEL \(BA\)](#)
3. [FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE CURRALINHO, EM SÃO GABRIEL \(BA\)](#)
4. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM LAPÃO \(BA\)](#)
5. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM PARATINGA \(BA\)](#)
6. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM JOÃO DOURADO \(BA\)](#)
7. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ÉRICO CARDOSO \(BA\)](#)
8. [FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CORRENTINA \(BA\)](#)
9. [LEVANTAMENTO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO RIO DE ONDAS, AFLUENTE DO RIO GRANDE \(BA\)](#)
10. [EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM ITAGUAÇU DA BAHIA \(BA\)](#)
11. [ESTUDOS DA BIODIVERSIDADE NA BHSF](#)
12. [OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM PARAMIRIM, ÉRICO CARDOSO E CATURAMA \(BA\)](#)
13. [ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO SF](#)
14. [OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO CORRENTE, EM CORRENTINA \(BA\)](#)
15. [EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA](#)
16. [FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO E SUBMÉDIO SF](#)
17. [PIPs DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO \(ALTO E MÉDIO SF\)](#)
18. **EM BREVE NO MÉDIO SÃO FRANCISCO**

BAIXO SÃO FRANCISCO

1. [EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E UNIDADE DE TRANSBORDO DE REJEITOS URBANOS DE PROPRIÁ/SE](#)
2. [ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA GALPÕES DE TRIAGEM E PÁTIOS DE COMPOSTAGEM - CONBASE](#)
3. [EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PENEDO \(AL\) \(RESCINDIDO\)](#)
4. [EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PENEDO \(AL\) \(NOVO CONTRATO\)](#)
5. [ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REDE DE ESGOTO EM PENEDO \(AL\)](#)
6. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM TRAIPU \(AL\)](#)
7. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM SANTANA DO IPANEMA \(AL\)](#)
8. [SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOM. EM PEDRO ALEXANDRE \(BA\)](#)
9. [AEROLEVANTAMENTO A LASER NO RIO SÃO FRANCISCO, DE PAULO AFONSO À FOZ](#)
10. [MACRODRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ALDEIA XOKÓ, PORTO DA FOLHA \(SE\)](#)
11. [ASSESSORAMENTO TÉC. FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS DA MACRODRENAGEM NA ALDEIA XOKÓ, PORTO DA FOLHA \(SE\)](#)
12. [PIPs DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO SUBMÉDIO E BAIXO SF](#)
13. **EM BREVE NO BAIXO SÃO FRANCISCO**



A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.

O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.

TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



APOIO AO COMITÊ NA LOGÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM REUNIÕES E EVENTOS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
KEPLER VIAGENS, EVENTOS
E TURISMO EIRELI



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
29/03/2022



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 5.077.723,96



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 3.723.027,57 (INVESTIMENTO)
R\$ 341.054,76 (CUSTEIO)



NÚMERO DO CONTRATO
008/2022




PRÓXIMAS ETAPAS
Reuniões de Câmaras Técnicas e CRRs
e eventos diversos



FISCAL TÉCNICO APV
SÂMELA BITENCOURT



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
01/04/2022



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
011/2022



FISCAL TÉCNICO APV
DANIEL BRITO



EMPRESA CONTRATADA
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 6.628.373,63





VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 6.253.885,97



PRÓXIMAS ETAPAS
Assessoria continuada, novos episódios
do podcast Travessia e produção de vídeos

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E
ASSESSORIA AMBIENTAL



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/01/2025



VALOR MÁXIMO GLOBAL DO TDR
R\$ 1.818.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 181.780,98



NÚMERO DO CONTRATO
086/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do website e materiais gráficos



FISCAL TÉCNICO APV
MAURÍCIO OLIVEIRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**




TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS – LOTES 1, 2, 3 e 4



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
CNPJ 43.109.155/0001-73



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
10/02/2025



VALOR TOTAL DOS CONTRATOS
R\$ 266.504,04



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DOS CONTRATOS
011, 012, 013 e 014/2025



PRÓXIMAS ETAPAS
Conforme a programação de reuniões
do Comitê



FISCAL TÉCNICO APV
MAURÍCIO OLIVEIRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MANEJO DA IRRIGAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – 1º T.A. (2025)



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
ÁGUA E SOLO ESTUDOS
E PROJETOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
30/05/2023
1º T.A. assinado em: 19/12/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.641.757,08



DURAÇÃO DO PROJETO
26 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.094.594,72



NÚMERO DO CONTRATO
015/2023



PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Plano de Trabalho
(Ciclo de Capacitações 2025)



FISCAL TÉCNICO APV
MANOEL VIEIRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO SF



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (PRH-SF 2016-2025)



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
CONSÓRCIO RHA-ALPHAP



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
10/12/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 520.596,77



DURAÇÃO DO PROJETO
09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 31.235,81



NÚMERO DO CONTRATO
078/2024





PRÓXIMAS ETAPAS
P02, P03 e P04 (Relatórios analíticos sobre os dados de proteção da natureza, patrimônio, ecologia, geologia, hidrogeologia, solos, qualidade das águas)



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

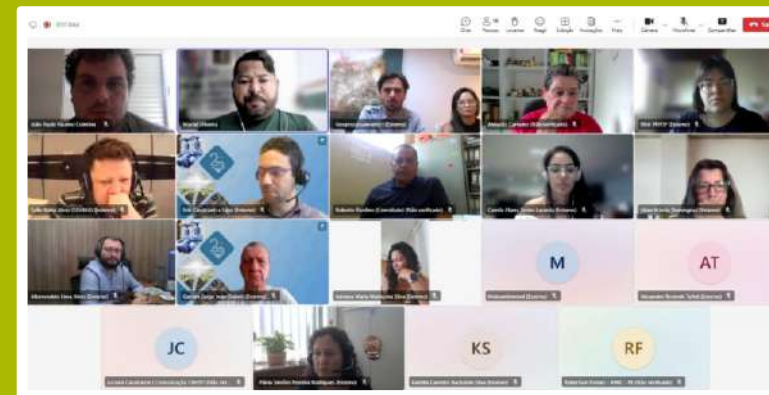

TODA A BACIA DO SF



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E OBRAS DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
HIDROBR CONSULTORIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
11/06/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.741.827,36



DURAÇÃO DO PROJETO
20 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 627.057,85



NÚMERO DO CONTRATO
014/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Produto 02.7



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



EMPRESA CONTRATADA

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 1.659.445,18
R\$ 1.701.792,02 (REAJUSTE ANUAL)



DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25

R\$ 1.011.954,36



NÚMERO DO CONTRATO

020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS

Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento (SF5) e aprovação do programa de efetivação (SF6)



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO





FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



FISCAL CONTRATADO

PEDRO LUCAS COSMO DE BRITO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 113.798,74
R\$ 116.628,37 (REAJUSTE ANUAL)



DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25

R\$ 78.111,10



NÚMERO DO CONTRATO

027/2022



PRÓXIMAS ETAPAS


Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento (SF5) e aprovação do programa de efetivação (SF6)



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO





PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO VERDE GRANDE
(SF10 E RPGA XXV)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/04/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
010/2024



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA
ENGEORPS ENGENHARIA S.A.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.102.913,00






VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 330.873,90



PRÓXIMAS ETAPAS
Aprovação Produto 3 – Prognóstico
Consulta Pública em 16/12/2024
Elaboração Produto 4 – Proposta de Metas e Alternativas

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

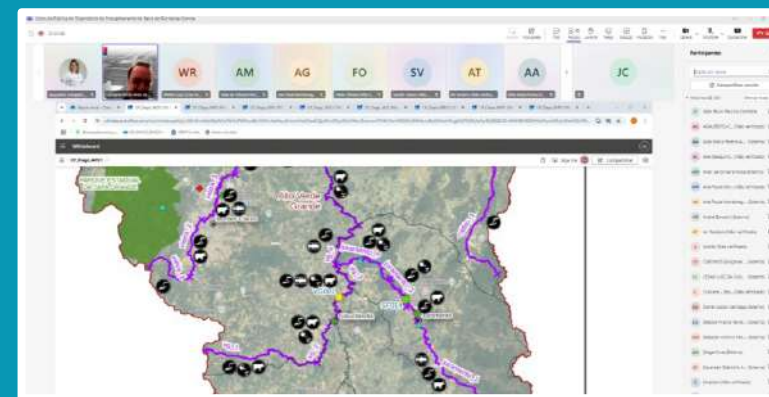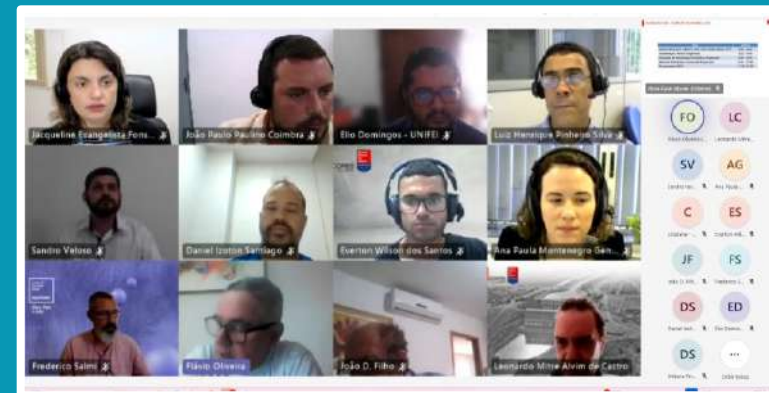



FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO VERDE GRANDE
(SF10 E RPGA XXV)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
19/08/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
041/2024



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA
ANDRÉ LUIZ BONACIN SILVA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 68.400,00






VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 13.680,00



PRÓXIMAS ETAPAS
Avaliação Produto 3 – Prognóstico

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

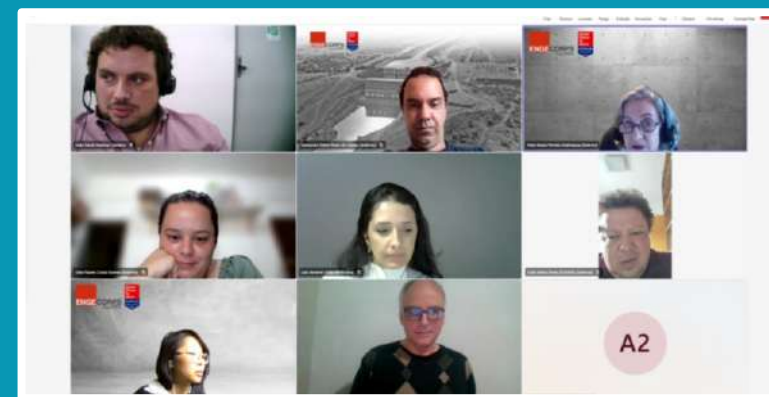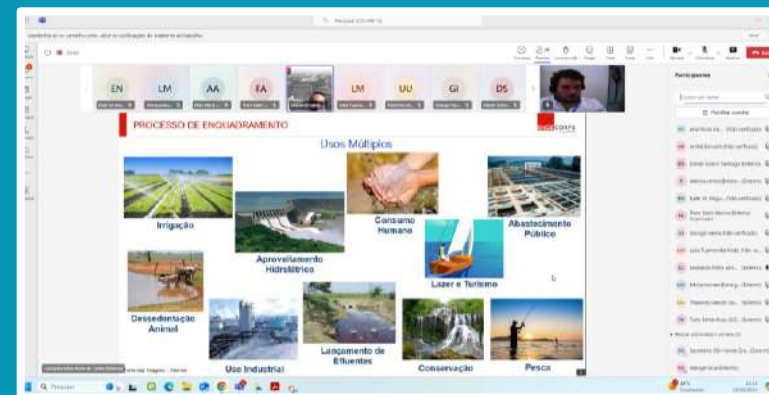

ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 1

GOVERNANÇA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PANDEIRO, CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DOS RIOS PANDEIROS, CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU (SF7, SF8, SF9, RPGA XXIV E UPGRH 11)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS) AGUARDANDO LICITAÇÃO



DURAÇÃO DO PROJETO 19 MESES



ATO CONVOCATÓRIO 033/2024



FISCAL TÉCNICO APV JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA AGUARDANDO LICITAÇÃO



VALOR MÁXIMO GLOBAL DO TDR R\$ 2.589.231,28




VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25 R\$ 0,00



PRÓXIMAS ETAPAS Em licitação Análise dos recursos

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

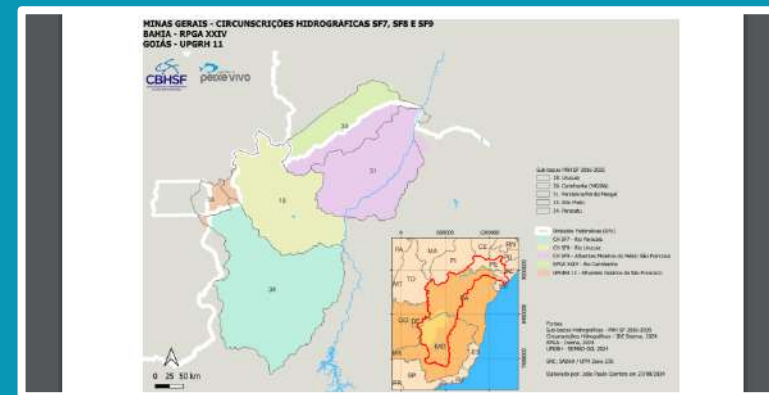


ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PANDEIRO, CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DOS RIOS PANDEIROS,
CARINHANHA, URUCUIA E PARACATU
(SF7, SF8, SF9, RPGA XXIV E UPGRH 11)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
AGUARDANDO LICITAÇÃO



DURAÇÃO DO PROJETO
19 MESES



ATO CONVOCATÓRIO
034/2024



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



FISCAL CONTRATADO
AGUARDANDO LICITAÇÃO



VALOR MÁXIMO GLOBAL DO TDR
R\$ 185.197,32



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



PRÓXIMAS ETAPAS
Em licitação


PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE JAÍBA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
COMUNIDADE DE TAMBORIL,
JAÍBA (MG)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 717.896,59



DURAÇÃO DO PROJETO
05 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 717.896,59



NÚMERO DO CONTRATO
030/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Termo de entrega da obra



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO


100%



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAMONAS/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
LOCALIDADE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO EM MAMONAS (MG)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.239.410,91



DURAÇÃO DO PROJETO
07 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.239.410,91



NÚMERO DO CONTRATO
031/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Obra finalizada



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

100%



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
LOCALIDADE CACHOEIRA DOS FORROS EM PASSA TEMPO (MG)



EMPRESA CONTRATADA
MAIS AMBIENTE ENGENHARIA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.672.618,90



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.093.114,61



NÚMERO DO CONTRATO
034/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Boletim de Medição 06 (BM06)



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO




PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JEQUITIBÁ/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
JEQUITIBÁ (MG)



EMPRESA CONTRATADA
DACT ENGENHARIA LTDA.
(FISCALIZADA PELA PREFEITURA DE JEQUITIBÁ/MG)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.982.000,00 – Repassado APV
R\$ 318.000,00 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 429.524,71



NÚMERO DO CONTRATO
050/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
1. Aguardando 6ª medição da obra
2. Avaliação de aditivo (R\$ 980 mil)



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA




PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOAQUIM FELÍCIO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
JOAQUIM FELÍCIO (MG)



EMPRESA CONTRATADA
Licitação impugnada
Ajustes nas especificações
Previsão de nova licitação



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 6.860.000,00 – Repassado APV
R\$ 140.000,00 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
049/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA




PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BAMBUÍ/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
BAMBUÍ (MG)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 13.500.000,00 – Repassado APV
R\$ 500.000,00 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 569.012,49



NÚMERO DO CONTRATO
051/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando o BM nº 02



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA




PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE UNAÍ/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
UNAÍ (MG)



EMPRESA CONTRATADA
OBRA NÃO LICITADA AINDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 6.241.941,15 – Repassado APV
R\$ 506.103,34 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
052/2023





PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA




PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

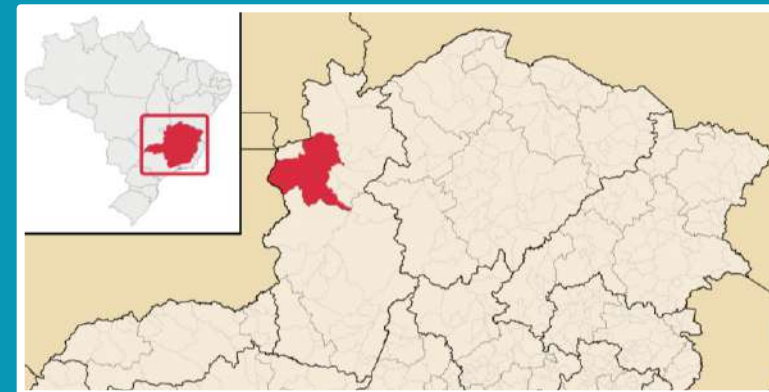

ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CARMO DO CAJURU/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
CARMO DO CAJURU (MG)



EMPRESA CONTRATADA
OBRA NÃO LICITADA AINDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 6.800.331,13 - Repassado APV
R\$ 138.782,27 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
017/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PASSA TEMPO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
PASSA TEMPO (MG)



EMPRESA CONTRATADA
OBRA NÃO LICITADA AINDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 5.441.700,00 – Repassado APV
R\$ 168.300,00 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
018/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



ALTO SÃO FRANCISCO



EIXO 5 BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO – ALTO SF E MÉDIO SF



LOCAL DE EXECUÇÃO
JANUÁRIA, CAETANÓPOLIS E PARAOPEBA (MG)



EMPRESA CONTRATADA
EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.956.708,73



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 782.683,49 (40% Alto + Médio SF)



NÚMERO DO CONTRATO
046/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Produto 04 – Projeto Básico e Executivo



FISCAL TÉCNICA APV
RAYSSA BALIEIRO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: Essa contratação envolve projetos no médio e no alto São Francisco





EM BREVE

NO ALTO SÃO FRANCISCO

MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADES RURAIS NO ENTORNO DA LAGOA DE ITAPARICA, EM XIQUE-XIQUE/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
XIQUE-XIQUE E GENTIO DO OURO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
16/02/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 341.673,13



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 341.673,13



NÚMERO DO CONTRATO
001/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Contratação da execução das obras



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

100%



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CURRALINHO, SÃO GABRIEL/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
SÃO GABRIEL (BA)



EMPRESA CONTRATADA
WD SILVA ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
Expectativa de OS no fim de outubro



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 5.400.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.055.571,33



NÚMERO DO CONTRATO
054/2024




PRÓXIMAS ETAPASA
Aguardando BM nº 04



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CURRALINHO, SÃO GABRIEL/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
SÃO GABRIEL (BA)



EMPRESA CONTRATADA
AGUARDANDO LICITAÇÃO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
AGUARDANDO LICITAÇÃO



VALOR MÁXIMO GLOBAL DO TDR
R\$ 343.066,94




DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 75.474,73



ATO CONVOCATÓRIO
030/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando RF - 04



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE EM LAPÃO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
27/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.549.362,02



DURAÇÃO DO PROJETO
07 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.777.198,28



NÚMERO DO CONTRATO
047/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Boletim de Medição 06 (BM06)



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE PARATINGA/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
COMUNIDADE DE POÇÃO DE SANTO ANTÔNIO EM PARATINGA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.917.206,32



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 641.746,95



NÚMERO DO CONTRATO
048/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Boletim de Medição 06 (BM06)



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
COMUNIDADE DE MATA DO MILHO EM JOÃO DOURADO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
27/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.647.265,28



DURAÇÃO DO PROJETO
07 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.661.563,55



NÚMERO DO CONTRATO
049/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Boletim de Medição 06 (BM06)



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO




MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2

QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÉRICO CARDOSO/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
ERICO CARDOSO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
OBRA NÃO LICITADA AINDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.699.573,33 – Repasse APV
R\$ 5.000.000,00 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
02/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

0%



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2

QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CORRENTINA/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
CORRENTINA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
OBRA NÃO LICITADA AINDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
NÃO SE APLICA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 12.270.123,18 – Repasse APV
R\$ 250.410,68 – Contrapartida prefeitura



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
03/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Aguardando licitação



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 3

QUANTIDADE DE
ÁGUA E USOS
MÚLTIPLOS



LEVANTAMENTO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS NO RIO DE ONDAS, AFLUENTE DO RIO GRANDE, BAHIA, POR MEIO DE AEROFOTOGRAFIA E PERFILAMENTO A LASER



LOCAL DE EXECUÇÃO
RIO DE ONDAS (BA)



EMPRESA CONTRATADA
SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS
ESPECIALIZADOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
11/03/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 396.500,00



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 317.200,00



NÚMERO DO CONTRATO
007/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Produto Final está aprovado.





FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%

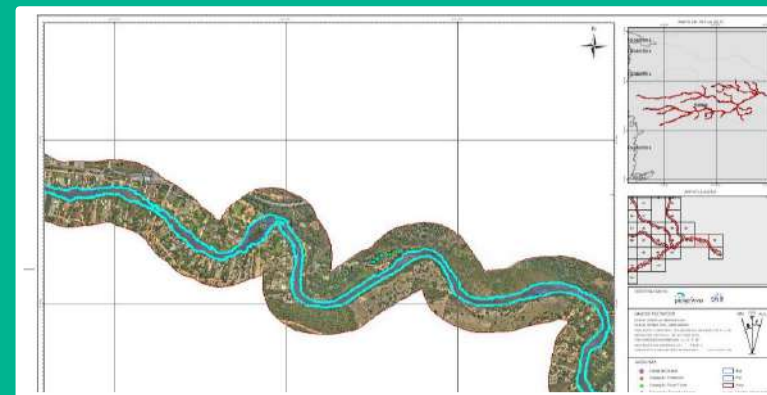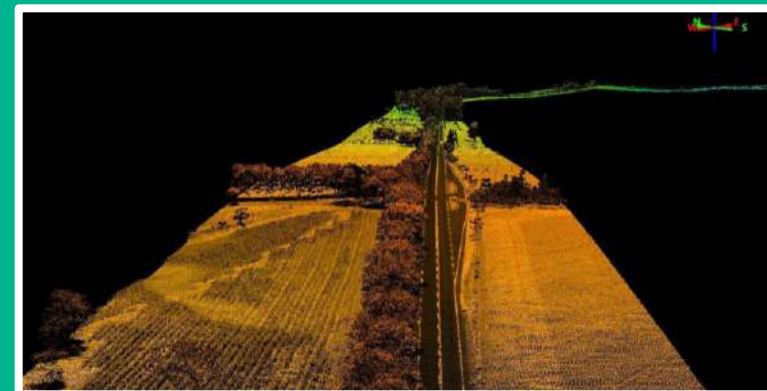

MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 4

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO



EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM ITAGUAÇU DA BAHIA/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
ITAGUAÇU DA BAHIA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
W2 ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
05/07/2022



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 704.679,75



DURAÇÃO DO PROJETO
34 MESES (1º ADITIVO DE PRAZO)



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 537.165,76



NÚMERO DO CONTRATO
035/2022




PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 15



FISCAL TÉCNICO APV
RAYSSA BALIEIRO



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO




MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



ESTUDOS TÉCNICOS PARA DIAGNOSTICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO



LOCAL DE EXECUÇÃO

APA LAGOA ITAPARICA, APA DUNAS E VEREDAS DO BAIXO-MÉDIO SF (BA)



EMPRESA CONTRATADA

ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

03/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 728.091,90



DURAÇÃO DO PROJETO

06 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25

R\$ 291.236,76



NÚMERO DO CONTRATO

029/2024



PRÓXIMAS ETAPAS

Aprovação do Produto 3.1 –
Relatório de diagnóstico
confirmatório/conclusivo



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DE PARAMIRIM, ÉRICO CARDOSO E CATURAMA/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
PARAMIRIM, ÉRICO CARDOSO E
CATURAMA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
04/01/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.070.970,09
R\$ 1.076.245,66 (REAJUSTE ANUAL)



DURAÇÃO DO PROJETO
26 MESES (1º ADITIVO DE PRAZO)



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.076.245,66



NÚMERO DO CONTRATO
064/2022



PRÓXIMAS ETAPAS
Contrato finalizado



FISCAL TÉCNICO APV
RAYSSA BALIEIRO



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO



LOCAL DE EXECUÇÃO

BARRA DO MENDES, MULUNGU DO MORRO, ITAGUAÇU DA BAHIA E ÉRICO CARDOSO, CATURAMA E PARAMIRIM (BA)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
05/07/2022



DURAÇÃO DO PROJETO
31 MESES (1º ADITIVO DE PRAZO)



NÚMERO DO CONTRATO
034/2022



FISCAL TÉCNICO APV
RAYSSA BALIEIRO



EMPRESA CONTRATADA
HUGO LEONARDO FREIRE



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 263.678,22



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 235.942,77 (Redução contratual)



PRÓXIMAS ETAPAS
Contrato finalizado

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO

100%




MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO CORRENTE, NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
CORRENTINA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
09/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.723.842,61




DURAÇÃO DO PROJETO
10 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 358.455,68



NÚMERO DO CONTRATO
022/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 08



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
LAPÃO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
09/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.538.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
10 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 778.897,26



NÚMERO DO CONTRATO
053/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 06



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5 BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL



FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO E SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



LOCAL DE EXECUÇÃO
CORRENTINA E LAPÃO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HIDRICOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
25/06/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.000.120,70



DURAÇÃO DO PROJETO
17 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 584.070,49



NÚMERO DO CONTRATO
023/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Relatório de Fiscalização 09




FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: Essa contratação é de fiscalização para ações que estão ocorrendo tanto no médio quanto no submédio

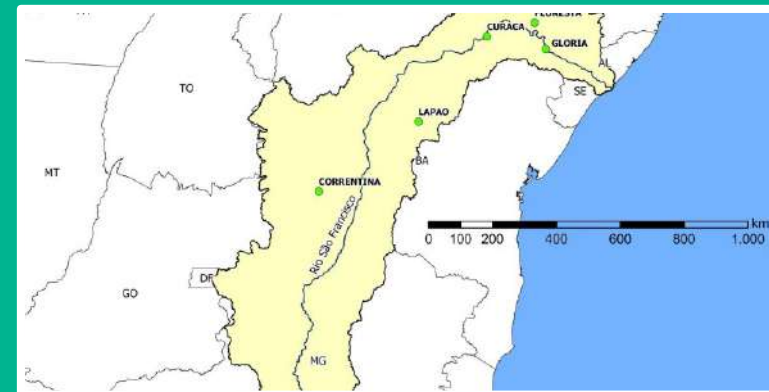

MÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO – ALTO E MÉDIO SF



LOCAL DE EXECUÇÃO
BOM JESUS DA LAPA E
FORMOSA DO RIO PRETO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.956.708,73



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 782.683,49 (40% Alto + Médio SF)



NÚMERO DO CONTRATO
046/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Produto 02 – Cadastro de Propriedades e Caracterização de Áreas degradadas




FISCAL TÉCNICO APV
RAYSSA BALIEIRO



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



OBS: Essa contratação envolve projetos no médio e no alto São Francisco

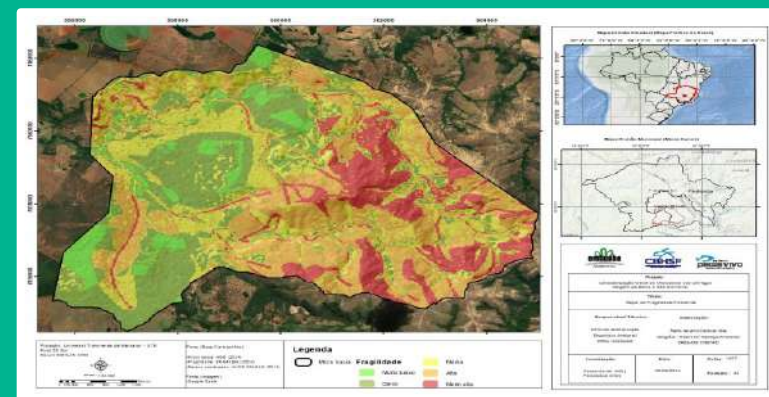



NO MÉDIO SÃO FRANCISCO


1. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADES RURAIS NO ENTORNO DA LAGOA DE ITAPARICA, EM XIQUE-XIQUE/BA

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 1

GOVERNANÇA E
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL



INSTALAÇÕES DE UNIDADE DE APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE POVOS TRADICIONAIS (UNEB) – JEREMOABO/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
JEREMOABO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
AGUARDANDO LICITAÇÃO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
AGUARDANDO LICITAÇÃO



VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
ENTRE R\$ 12 E R\$ 14 MILHÕES



DURAÇÃO DO PROJETO
12 – 18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
NÃO DEFINIDO



PRÓXIMAS ETAPAS

Aguardando formalização de ACT e revisão Orçamentária UNEB, avaliando a proposta de contrapartida



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2

QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE INHAPI/AL



LOCAL DE EXECUÇÃO
ALDEIA KOIUPANKÁ



EMPRESA CONTRATADA
RGA ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.100.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 923.336,45



NÚMERO DO CONTRATO
039/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
BM07



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL



LOCAL DE EXECUÇÃO
ALDEIA DA ETNIA JERIPANKÓ



EMPRESA CONTRATADA
W2 ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.001.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.360.448,36



NÚMERO DO CONTRATO
040/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
BM07



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARARI/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
COMUNIDADE SERRA DOS MORGADOS



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
27/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.229.931,84



DURAÇÃO DO PROJETO
13 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.374.183,95



NÚMERO DO CONTRATO
044/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
BM06



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO SEMIÁRIDO EM GLÓRIA/BA: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



LOCAL DE EXECUÇÃO
GLÓRIA (BA)



EMPRESA CONTRATADA
SOLARTERRA ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
19/06/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.550.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
11 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.024.245,55



NÚMERO DO CONTRATO
020/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 09



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5 BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO PAJEÚ EM FLORESTA (PE)



EMPRESA CONTRATADA
W2 ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
25/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.272.689,84



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 599.929,37



NÚMERO DO CONTRATO
037/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 08



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5 BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO MOCAMBO, EM CURAÇÁ (BA)



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIACHO MOCAMBO EM CURAÇÁ (BA)



EMPRESA CONTRATADA
AGRINATUS – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
25/10/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 976.909,15



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 316.308,42



NÚMERO DO CONTRATO
057/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Medição 05



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EIXO 5 BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL NO MÉDIO E SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



LOCAL DE EXECUÇÃO
GLÓRIA, (BA), FLORESTA (PE) E CURAÇÁ (BA)



EMPRESA CONTRATADA
GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HIDRICOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
25/06/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.000.120,70



DURAÇÃO DO PROJETO
17 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 584.070,49



NÚMERO DO CONTRATO
023/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Relatório de Fiscalização 09




FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: Essa contratação é de fiscalização para ações que estão ocorrendo tanto no médio quanto no submédio

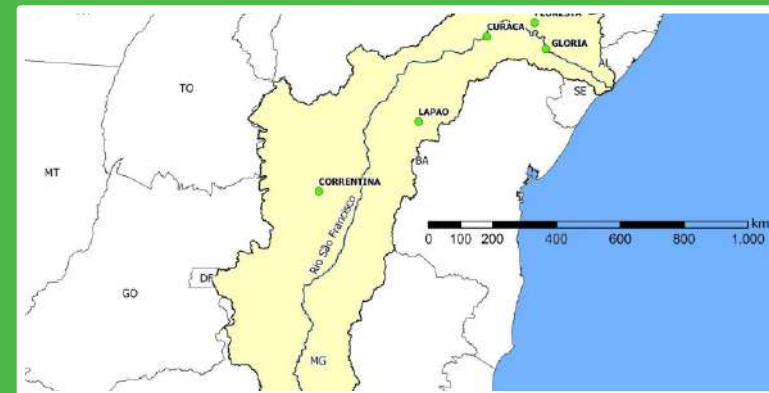

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO



EXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO – SUBMÉDIO SF E BAIXO SF



LOCAL DE EXECUÇÃO
PETROLÂNDIA (PE) E
PILÃO ARCADEO (BA)



EMPRESA CONTRATADA
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.805.107,00



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 541.532,10



NÚMERO DO CONTRATO
050/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
1 Entrega do Produto 04 – Projetos Executivos
2 Individuais por Propriedade
3



FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: Essa contratação envolve projetos no submédio e no baixo São Francisco





NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

1. REVITALIZAÇÃO E HIDROLOGIA SOCIAL NA BACIA DO ALTO IPANEMA, PESQUEIRA/PE.

BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E UNIDADE DE TRANSBORDO DE REJEITOS URBANOS DE PROPRIÁ/SE



LOCAL DE EXECUÇÃO
PROPRIÁ (SE)



EMPRESA CONTRATADA
Aguardando licitação



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
Aguardando licitação



VALOR MÁXIMO DO TDR
R\$ 3.813.866,82



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ -



ATO CONVOCATÓRIO
004/2025




PRÓXIMAS ETAPAS
Contratação da executora



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

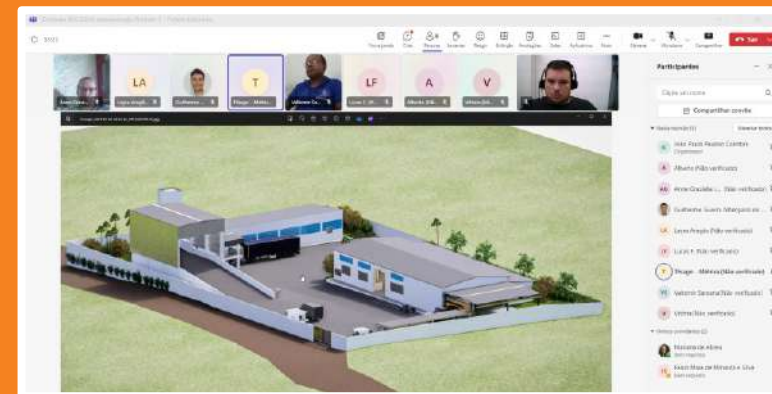

BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA GALPÕES DE TRIAGEM E PÁTIOS DE COMPOSTAGEM - CONBASF



LOCAL DE EXECUÇÃO

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CAPELA, MONTE ALEGRE DE SERGIPE, NEÓPOLIS, TELHA (SE)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

16/01/2025



DURAÇÃO DO PROJETO

12 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

001/2025



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA

INCIBRA LTDA.



VALOR MÁXIMO GLOBAL DO TDR

R\$ 1.325.505,94



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25

R\$ 0,00



PRÓXIMAS ETAPAS

1. Visita de reconhecimento realizada pela INCIBRA entre 17 e 20/02/2025
2. Entrega Produto 01

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO CENTRO HISTÓRICO DE PENEDO/AL COM A ETE EXISTENTE



LOCAL DE EXECUÇÃO
PENEDO (AL)



EMPRESA CONTRATADA
W2 ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
21/11/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.100.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
11 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 441.228,08



NÚMERO DO CONTRATO
035/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
CONTRATO RESCINDIDO
Multa de R\$ 157 mil
Parcelamento e pagamento 5/8



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA **peixe vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO CENTRO HISTÓRICO DE PENEDO/AL COM A ETE EXISTENTE



LOCAL DE EXECUÇÃO
PENEDO (AL)



EMPRESA CONTRATADA
RGA ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
01/10/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.677.381,14



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 42.281,86



NÚMERO DO CONTRATO
055/2023



PRÓXIMAS ETAPAS

- BM – 05
- Nova Liberação do IPHAN em Fev/25
- Licenciamento Ambiental PMP Fev/25



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO HISTÓRICO DE PENEDO/AL



LOCAL DE EXECUÇÃO
PENEDO (AL)



EMPRESA CONTRATADA
THIAGO BARBOSA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
27/11/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 275.616,00



DURAÇÃO DO PROJETO
10 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 229.680,00



NÚMERO DO CONTRATO
053/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
RF - 13



FISCAL TÉCNICO APV
THIAGO LANA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO



EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE TRAIPU/AL



LOCAL DE EXECUÇÃO
QUILOMBO LAGOÁ DO TABULEIRO EM TRAIPU (AL)



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.969.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 510.755,72



NÚMERO DO CONTRATO
042/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
BM06



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL



LOCAL DE EXECUÇÃO
QUILOMBO BAIXIO DO TAMANDUÁ E POVOADO DE ÓLEO EM SANTANA DO IPANEMA (AL)



EMPRESA CONTRATADA
RGA ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.513.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 942.474,65



NÚMERO DO CONTRATO
043/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
BM06



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 2 QUALIDADE DA ÁGUA E SANEAMENTO

CBHSF
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

AGÊNCIA
peixe vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE/BA



LOCAL DE EXECUÇÃO
BARREIRAS EM PEDRO ALEXANDRE (BA)



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
27/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.074.980,00



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 1.569.301,60



NÚMERO DO CONTRATO
045/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
BM06



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

50%



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 3 QUANTIDADE DE
ÁGUA E USOS
MÚLTIPLOS



LEVANTAMENTO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS NO RIO SÃO FRANCISCO, DA JUSANTE DE PAULO AFONSO ATÉ A FOZ, POR MEIO DE AEROFOTOGRAFIA E PERFILAMENTO A LASER



LOCAL DE EXECUÇÃO
PERNAMBUCO, ALAGOAS E SERGIPE



EMPRESA CONTRATADA
SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS
ESPECIALIZADOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/05/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 282.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 253.800,00



NÚMERO DO CONTRATO
012/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Produto Final está aprovado.





FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%

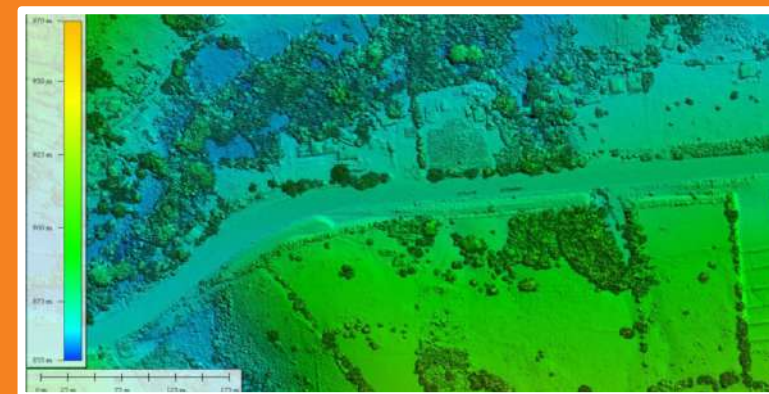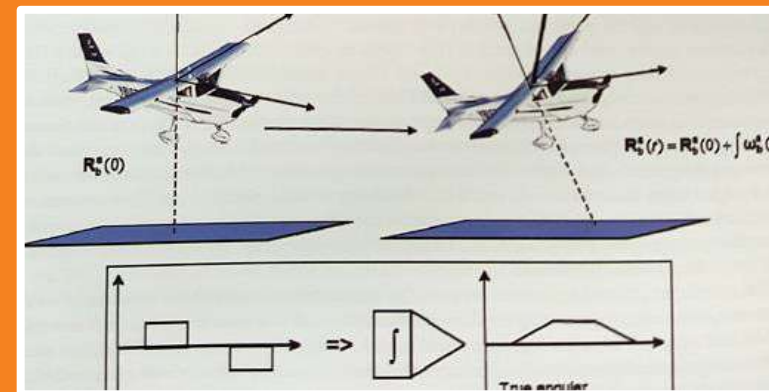

BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL



EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DA MACRODRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ALDEIA XOKÓ, PORTO DA FOLHA/SE



LOCAL DE EXECUÇÃO
ALDEIA XOKÓ EM PORTO DA FOLHA (SE)



EMPRESA CONTRATADA
RGA ENGENHARIA EIRELLI



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
03/06/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.341.177,17



DURAÇÃO DO PROJETO
10 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 3.022.537,71



NÚMERO DO CONTRATO
013/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
BM09



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE
E REQUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL


COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO SÃO FRANCISCO


AGÊNCIA
peixe
vivo
Agência de Bacia Hidrográfica

ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DA MACRODRENAGEM NA ALDEIA XOKÓ, PORTO DA FOLHA/SE



LOCAL DE EXECUÇÃO
ALDEIA XOKÓ EM PORTO DA FOLHA (SE)



EMPRESA CONTRATADA
RODRIGO LESSA GOMES



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
16/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 107.640,00



DURAÇÃO DO PROJETO
10 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 94.185,00



NÚMERO DO CONTRATO
028/2024





PRÓXIMAS ETAPAS
Produto RF08



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME CARVALHO



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

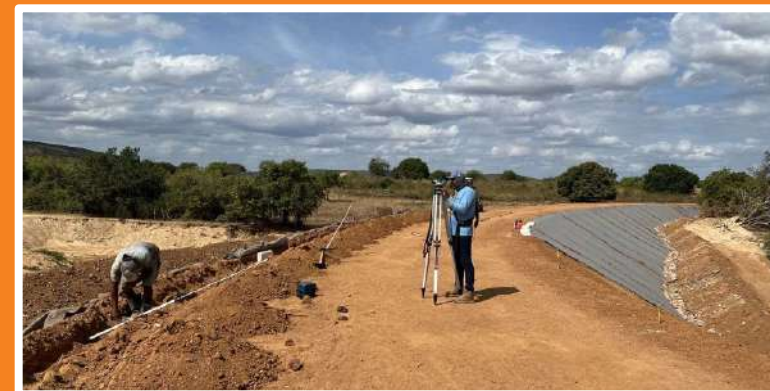

BAIXO SÃO FRANCISCO



EIXO 5

BIODIVERSIDADE E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL



PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM MICROBACIA DO RIO SÃO FRANCISCO – SUBMÉDIO SF E BAIXO SF



LOCAL DE EXECUÇÃO
JAPARATUBA E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (SE)



EMPRESA CONTRATADA
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/08/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.805.107,00



DURAÇÃO DO PROJETO
14 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/25
R\$ 541.532,10 (30% no submédio SF)



NÚMERO DO CONTRATO
050/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Produto 1 – Diagnóstico das microbacias e Bases de Dados Geográficos. Contrato iniciado pelo submédio.




FISCAL TÉCNICO APV
PAULO SÉRGIO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: Essa contratação envolve projetos no submédio e no baixo São Francisco

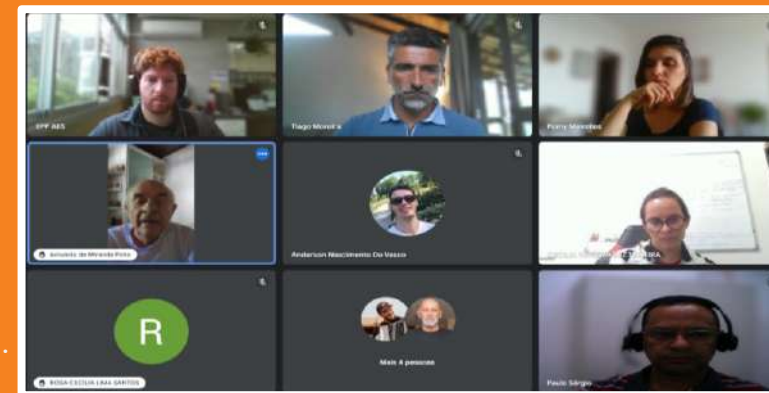



NO BAIXO SÃO FRANCISCO

1. PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU/AL
2. PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS PARA O MUSEU VELHO CHICO EM TRAIPU/AL
3. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO CURSO DO RIO SÃO FRANCISCO
4. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O VIVEIRO DE MUDAS DA ASSOCIAÇÃO AROEIRA DE PIAÇABUÇU/AL
5. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MODELAGEM HIDROLÓGICA COMPUTACIONAL NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO AQUÍFERO BARREIRAS, NO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO

EXPEDIENTE

CBH DO RIO SÃO FRANCISCO

José Maciel Nunes de Oliveira
Presidente

Marcus Vinicius Polignano
Vice-presidente

Almacks Luiz Carneiro da Silva
Secretário

Altino Rodrigues
Coordenador da CCR Alto São Francisco

Ednaldo Campos
Coordenador da CCR Médio São Francisco

Cláudio Ademar
Coordenador da CCR Submédio São Francisco

Anivaldo Miranda
Coordenador da CCR Baixo São Francisco

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente do Conselho de Administração

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças


Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração

André Amaral Horta
Gerente de Gestão Estratégica

Daniel Alexandre de Brito
Analista de comunicação
Produção, projeto gráfico e revisão final

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico
Produção e revisão final



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, nº 625, sala 211, Edf. The Square Park Office, Jatiúca, Maceió/AL - CEP 57.036-000
www.cbhsaofrancisco.org.br | @cbhsaofrancisco

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.agenciapeixevivo.org.br | @agenciapeixevivo



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, nº 625, sala 211, Edf. The Square Park Office, Jatiúca, Maceió/AL - CEP 57.036-000
www.cbhsaofrancisco.org.br | @cbhsaofrancisco

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.agenciapeixe vivo.org.br | @agenciapeixe vivo
